

# ブロック塀等の点検表


※判断できない場合は、「不適合」にチェックしてください。

「安全性が確認できないもの」とは、該当するブロック塀の①から⑧の点検項目で「不適合」が1つ以上あるものをいう。

申請者 \_\_\_\_\_


## ▶コンクリートブロック塀の場合

※各項目の はい・いいえ どちらかを○で囲んでください。

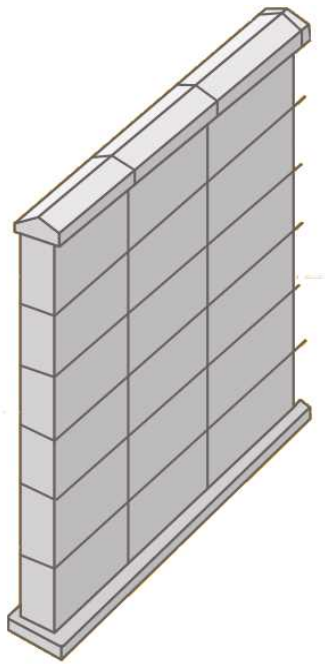

点検項目		点検内容	点検結果	
			適合	不適合
①	高さ	2.2m以下	はい	いいえ
②	壁の厚さ	高さ2mを超える塀で15cm以上 高さ2m以下の塀で10cm以上	はい	いいえ
			はい	いいえ
③	鉄筋	壁内に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm以下の間隔で入っており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている	はい	いいえ
④	控壁 (高さ1.2mを超える時)	塀の長さ3.4m以下ごとに、直径9mm以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの1/5以上突出してある	はい	いいえ
⑤	基礎 (高さ1.2mを超える時)	丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある	はい	いいえ
⑥	傾き、ひび割れ	全体的に傾いていない、1mm以上のひび割れがない	はい	いいえ
⑦	ぐらつき	人の力でぐらつかない	はい	いいえ
⑧	その他	塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上でない	はい	いいえ

## ▶組積造等の場合（鉄筋が入っていないコンクリートブロック塀を含む）

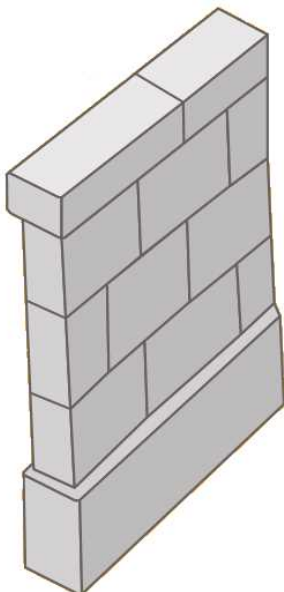

点検項目		点検内容	点検結果	
			適合	不適合
①	高さ	1.2m以下	はい	いいえ
②	壁の厚さ	各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある	はい	いいえ
			はい	いいえ
③	鉄筋	-	-	-
④	控壁	塀の長さが4m以下ごとに壁面からその部分の②の1.5倍以上突出している。又は②が必要寸法の1.5倍以上ある	はい	いいえ
⑤	基礎	根入れ深さが20cm以上ある	はい	いいえ
⑥	傾き、ひび割れ	全体的に傾いていない、1mm以上のひび割れがない	はい	いいえ
⑦	ぐらつき	人の力でぐらつかない	はい	いいえ
⑧	その他	塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上でない	はい	いいえ
